

## ①G I G Aスクール構想に伴う工事の進捗状況について

### ○小中学校校内LAN整備工事

- ・契約業者 張山電気 株式会社
- ・工 期 令和2年9月4日から令和3年3月19日
- ・進 捗 率 令和3年1月29日現在 60%  
(2月上旬で配線工事終了。2月末までに機器取付け完了予定)

### ○小中学校タブレット端末充電保管庫設置工事

- ・契約業者 張山電気 株式会社
- ・工 期 令和2年11月7日から令和3年3月19日
- ・進 捗 率 令和3年1月29日現在 20%  
(配線工事完了。2月中旬までに機器取付け完了予定)

### ○小中学校タブレット端末購入

- ・契約業者 株式会社 ビジネスサービス弘前支店
- ・納 期 令和2年10月8日から令和3年3月12日
- ・進捗状況 令和3年2月26日頃納入予定

# オフィス家具メーカー オカムラが作る GIGAスクール専用のタブレット端末充電保管庫 - 3

## A-2. 45台仕切板式収納タイプ

本体寸法 800W×550D×1365H

## B-2. 25台仕切板式収納タイプ


本体寸法 550W×550D×1365H

\* 幅370mm、高さ280mm、厚さ35mmまでのノートPCが収納可能。

(45台収納は15台×3段、25台収納は10台×3段収納)

\* 収納する端末の厚みが25mm以上の場合はこちらの仕切板タイプを使用して下さい。

\* 樹脂製の仕切板で、端末が傷つくのを防ぎます。

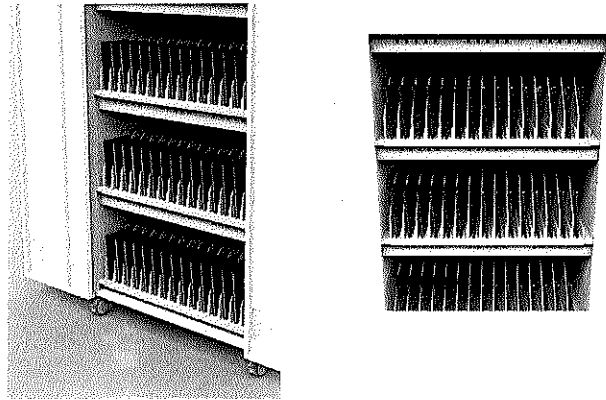

\* 本体仕様、輪番ユニットともトレイ式と同じです。

### ● 共通仕様

棚板：スチール焼付塗装、把手：ABS樹脂／キャスター：ポリアミド  
トレイ（仕切り板）：ABS樹脂、

通電・充電確認用LEDランプ／スイッチ、15Aサーキットブレーカー付  
リレー回路内蔵 定格100V 15A 1500W 50/60Hz

